


18:402

Nykyiset rungot ja kaide

Lititty nykyiseen maapintaan

Suorite / työ	Aloitus	Kesto
Työmaan perustaminen	5.1.2026	1
Keuyr purku	5.1.2026	28
Asbestisaneeraus sisällä	7.1.2026	21
Rungon purku	2.2.2026	35
Betonijätteen ajo vaihe 1	23.2.2026	7
Perustusten purku	2.3.2026	35
Betonijätteen ajo vaihe 2	23.3.2026	14
Betonijätteen murskaus	30.3.2026	14
Lutskaukset	13.4.2026	7
Viimeistely	20.4.2026	7

Almon koulu

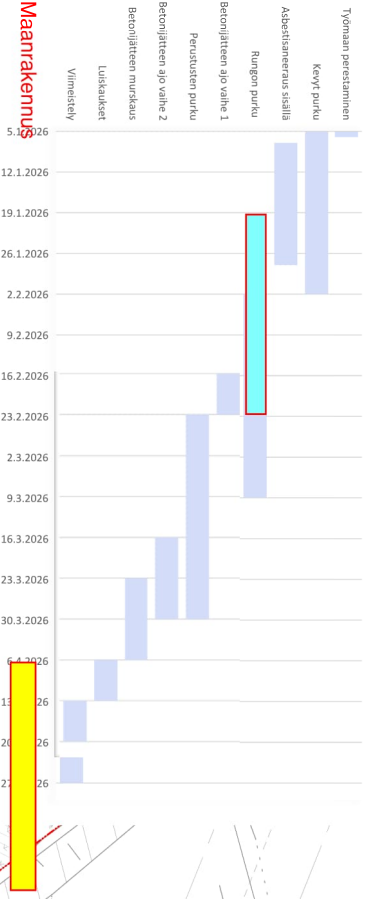

- Huutokauppa vk 27-28.12
- * vk 52 loppuun valmis
- * 31.1.2025 tavarat haetuna
- * Sähköille katkeaa 13.1.2026, Jukka
- * kaukoilämpö 31.12.2025 pois, Jukka
- * ATK 31.12.2025 pois, Jukka
- Asbestipurku vk 51-52?
- * k.krs
- Keuyrpurku vk 1
- * 4 krs --> K krs
- Rungon purku vk 3-->
- Kallion pinnan tarkastelu n vk 7-8
- Maanrakennustyöt alk vk 15

Kallion pinta tärkeä tietää

